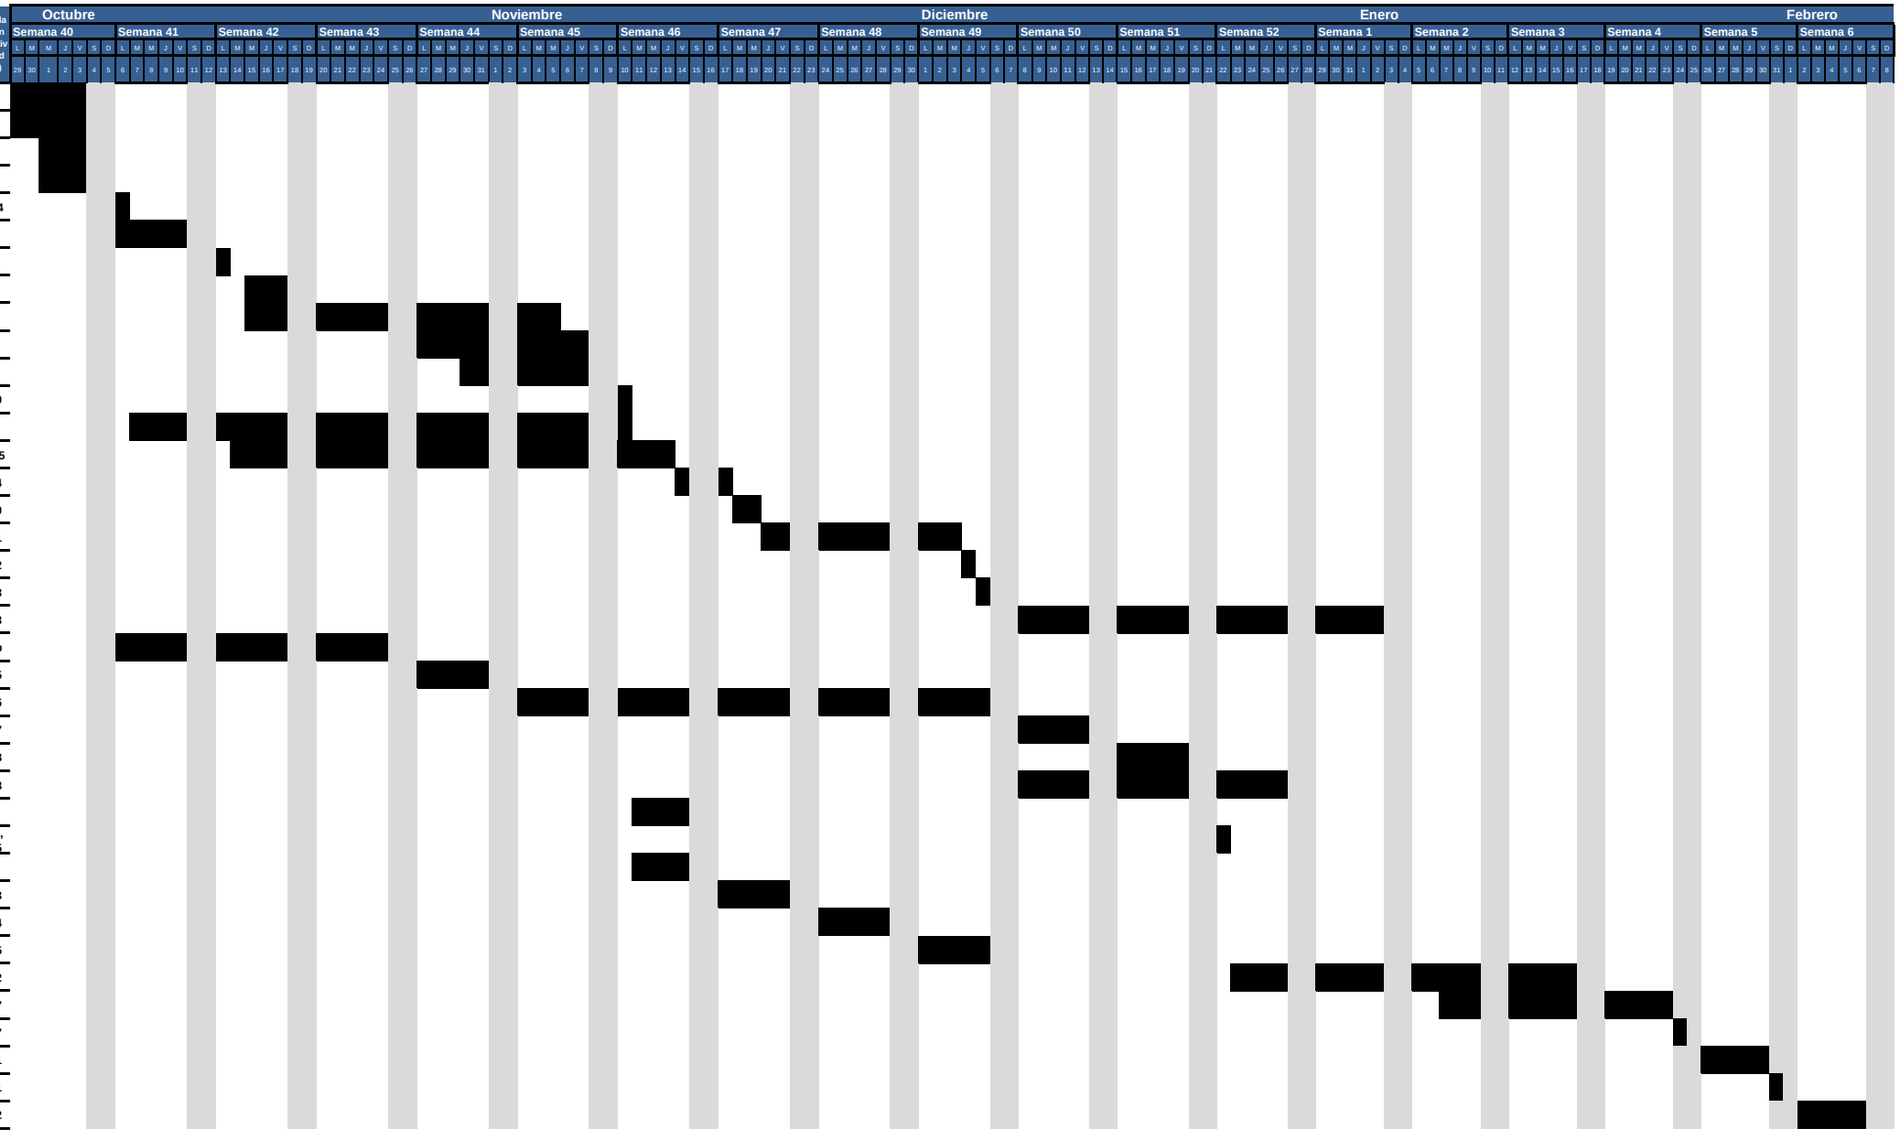Nº	ACTIVIDAD	Responsable				Inicio	Tiempo (Dias Habiles)	Prelación (Actividad Nº)
		CE	AEUSB	CVR	Candidatos			
1	Instalación de la Comisión Electoral	X				29/9/14	5	--
2	Revisión del Reglamento Electoral General	X				29/9/14	5	1
3	Revisión del cronograma electoral con la AEUSB	X	X			1/10/14	3	1
4	Revisión del cronograma electoral con la comisión de voto remoto	X		X		1/10/14	3	1
5	Publicación del cronograma electoral		X			6/10/14	1	3,4
6	Entrega, preparación y proceso de revisión de Registro Electoral Preliminar		X			6/10/14	5	1
7	Aprobación del Registro Electoral Preliminar	X				13/10/14	1	4
8	Publicación del Registro Electoral Preliminar		X			15/10/14	3	7
9	Actualización de la Base de Datos de Egresados		X			15/10/14	16	5
10	Cierre Registro Electoral Preliminar. Período para auditorías e impugnaciones	X				27/10/14	10	6
11	Correcciones al registro electoral preliminar (si hay impugnaciones)		X			30/10/14	7	7
12	Aprobación y Publicación Registro Electoral Definitivo	X				10/11/14	1	10
13	Convocatoria a postulaciones de candidatos	X	X			7/10/14	25	5
14	Revisión de que los candidatos y sus postulantes estén en el Registro Electoral		X			14/10/14	23	9, 5
15	Devolución a postulados de comprobantes de aceptación de su candidatura	X				14/11/14	2	14
16	Publicación de la lista de candidatos		X			18/11/14	2	10
17	Período de impugnaciones a las postulaciones	X				20/11/14	10	11
18	Aprobación de postulaciones definitivas	X				4/12/14	1	12
19	Publicación de postulaciones definitivas		X			5/12/14	1	13
20	Campaña electoral				X	8/12/14	20	13
21	Revisión de opciones de software para voto electrónico	X		X		6/10/14	15	2b
22	Decisión acerca de desarrollo/parametrización de software para voto electrónico	X		X		27/10/14	5	15
23	Desarrollo/parametrización de software para voto electrónico	X		X		3/11/14	25	16
24	Primer Simulacro (Prueba de funcionamiento del software y los sistemas: stress, carga y transmision de datos, entre otras)	X		X		8/12/14	5	17
25	Segundo Simulacro (Prueba general del flujo de funcionamiento a traves de la Instalación de la Mesa Electoral Electrónica)	X		X		15/12/14	5	18
26	Publicación y divulgación de la metodología para la votación electrónica. Formación del electorado (Debería ser hasta el día antes de las elecciones)		X			8/12/14	15	18
27	Definición y aprobación de cantidad de mesas electorales a abrir	X				11/11/14	4	8
28	Constitución Mesa Electoral para Voto electrónico remoto	X		X		22/12/14	1	19, 25
29	Dimensionamiento de personal requerido para las mesas	X				11/11/14	4	8
30	Captación, Reclutamiento y Selección de personal para las mesas	X				17/11/14	5	23
31	Formación y acreditación de personal para las mesas y miembros de mesa y testigos	X		X		24/11/14	5	24
32	Constitución Mesa(s) Electoral(es) (para el voto por correo postal y, posteriormente, el voto presencial)	X				1/12/14	5	25
33	Votación electrónica (comienza 10 días hábiles antes de la votación presencial y termina 16 h antes de iniciarla)	X		X		23/12/14	19	22
34	Votación por voto por correo postal	X	X			7/1/15	13	27
35	Votación presencial, Escrutinio, Totalización y Proclamación de Resultados	X	X			24/1/15	1	27
36	Impugnaciones	X				26/1/15	5	31
37	Adjudicación y Juramentación de los Representantes Electos	X	X			31/1/15	1	31
38	Elaboración de Informe final de Cierre de la elección	X				2/2/15	5	32
